


特小トランシーバー中継機点検作業 令和 6 年9月11日



ハツ面小学校

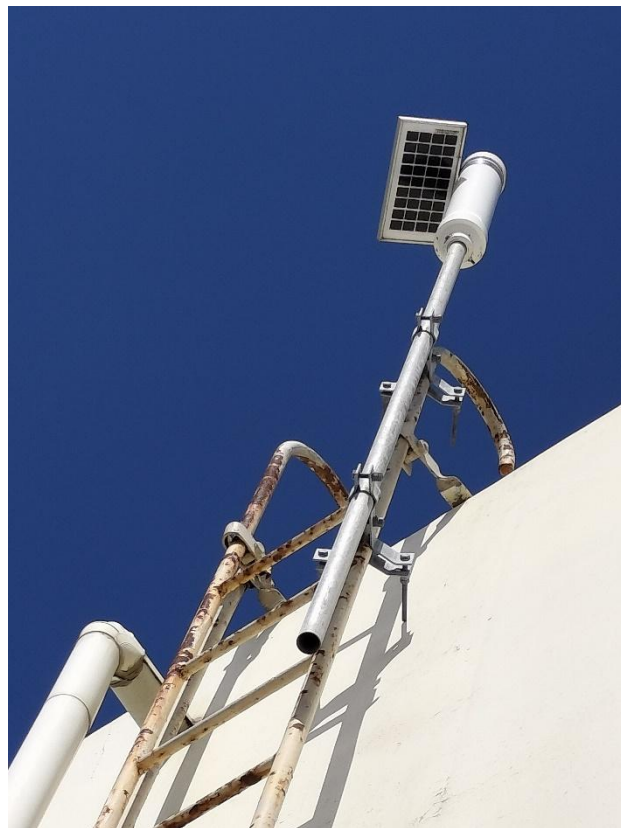

太陽光パネル取り付け蝶ナットが緩んでいてパネルが下向きになっていた。

点検作業後修正し直しておきました。ペンチで蝶ねじをしっかりと締め付けた。



鶴城小学校

太陽光パネル取り付けスクリューが緩くガタがある。

臨時的に、針金で縛っておいたが、取り付けを直す

必要がある。修正作業を依頼します。

福地南部小学校

パイプに取り付ける部分の内径の筒が外れていて
風で飛んで行きそう危ないから引き上げた



福地北部小学校

中継機本体取り付けボルトが無くなっていて、
ガタ、傾き、危険なので取り外して来た
内径の筒が抜けていて内部に入り込んでいた

